

1. Intressentanalys

Syfte: Identifiera och analysera de olika intressenterna i projektet, deras behov, samt deras påverkan och inflytande.

Intressent	Behov/intresse	Påverkan	Kommunikation
Företagsledning	Ökad lönsamhet, förbättrad IT-lösning, effektivare verksamhet	Hög	Regelbundna avstämningar och rapporter
Personal i skiduthyrningen	Enklare och snabbare hantering av uthyrning och återlämning, mindre stress och bättre arbetsmiljö	Hög	Workshops, utbildningar, veckovisa möten
Kunder (enskilda och grupper)	Snabbare uthyrningsprocess, förbättrad service	Medel	Digitala bokningsmöjligheter, kundfeedbacksystem
Bussbolag	Ett förbokningssystem som underlättar hantering av stora grupper	Medel	Förbokningssystem, samarbete kring uppgifter
SkiStar	Möjlighet till integration och partnerskap	Låg/Medel	Förhandlingar om samarbete
IT-leverantör	Implementering av ny teknisk lösning	Hög	Kravspecifikation, regelbundna möten
Ekonomiavdelning	Bättre kontroll över in- och utflöde av utrustning	Medel	Rapportering och ekonomiska analyser
Underhållspersonal	Tidig upptäckt av trasig utrustning och förbättrad rapportering	Medel	Digital skadehantering och rapportering

2. Visionsdokument

Vision:


Att skapa ett modernt och effektivt IT-stöd som förbättrar hanteringen av skiduthyrningen på Datadalens Sporthotell och Skiduthyrning AB. Målet är att minska köer, öka kontrollen över utrustningen och förbättra arbetsmiljön för personalen, samtidigt som kundupplevelsen optimeras.

Tid: 6 månader

Kostnad: 2 miljoner

Mål:

- **Effektivare och snabbare uthyrningsflöde:** Implementera ett förbokningssystem där kunder kan registrera sin utrustning i förväg för att minska köbildning och väntetider.
- **Bättre kontroll över utrustning:** Använd digital spårning av uthyrd utrustning för att hålla koll på utrustningen samt att skicka påminnelser vid sen återlämning.
- **Modernare betalningssystem:** Smidigare betalning via app eller online betalning för en snabb och enkel transaktion vilket minskar kontanthanteringen avsevärt.
- **Minskad arbetsbelastning för personalen:** Lättare för personalen vid användning av ett användarvänligt gränssnitt för snabbare hantering.
- **Ökat samarbete med bussbolag och SkiStar:** Förbättrad integration och logistik samt informationsdelning.

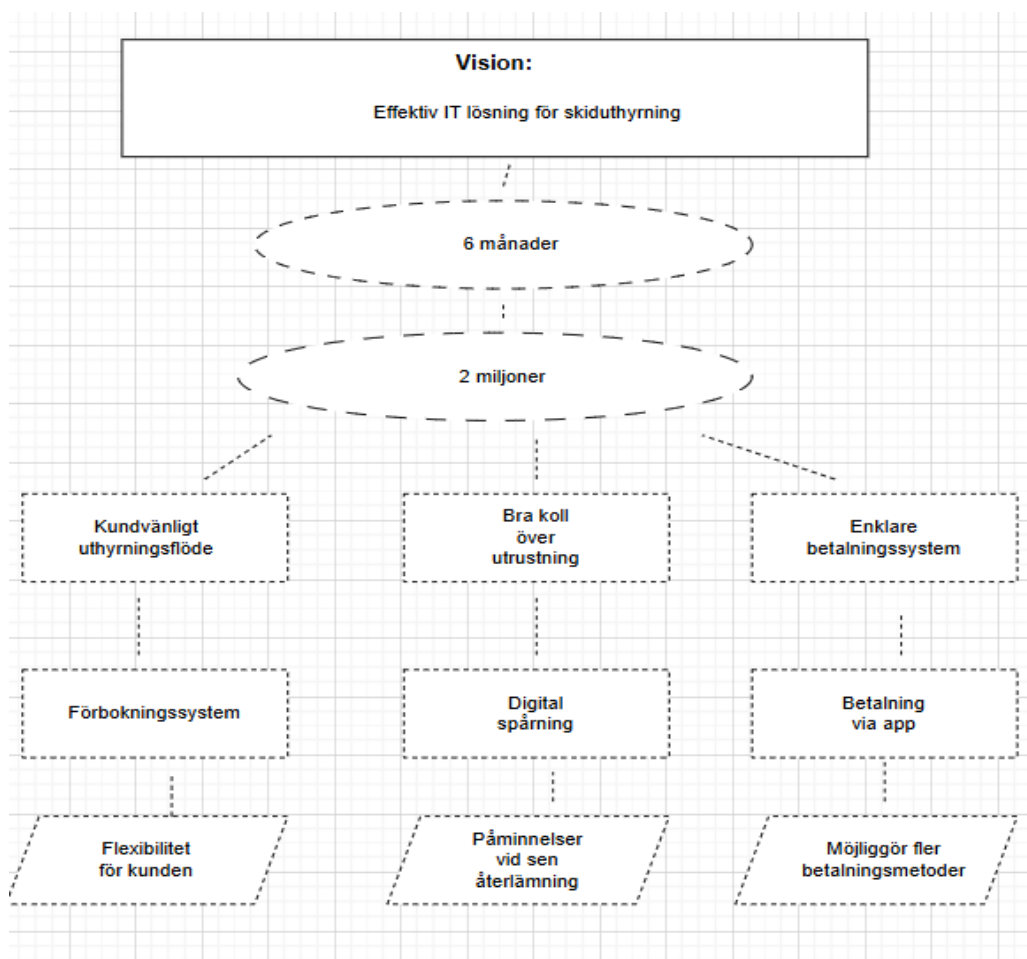

4. Färdplan

Produktuppdelning och planering (PBS)

För att säkerställa en genomförbar och hållbar implementering av projektet baseras planeringen på en detaljerad intressentanalys och verksamhetens identifierade behov. Detta skapar en stabil grund för en välfungerande teknisk

- **Huvudmål:** Implementera ett digitalt bokningssystem för att effektivisera skiduthyrningen och förbättra kundupplevelsen.
- **Bokningssystem:** En enkel plattform där kunder kan boka utrustning i förväg, vilket minskar köer och förbättrar flödet i uthyrningen.
- **Betalningslösningar:** Integration av digitala betalningsmetoder för att säkerställa en smidig och säker transaktionsprocess.
- **Kundhanteringsverktyg:** Digital lagring av kunduppgifter, bokningshistorik och preferenser för bättre service och en bättre anpassad upplevelse.
- **Lager- och uthyrningshantering:** Ett system som automatiserar uthyrningsprocessen, minskar manuellt arbete samt optimerar utrustningsflödet.
- **Kundfeedback och support:** Möjlighet för kunder att ge betyg och feedback samt tillgång till ett effektivt supportsystem vid behov.

5. Leveransplan

Projektfaser och tidsram

Projektet delas in i fyra tydliga faser för att säkerställa en strukturerad utvecklingsprocess och effektiv resursfördelning.

- **Fas 1: Planering (1: a månaden)**
 - Identifiering av intressenters behov och kravställning utifrån verksamhetsmål.
 - Val av tekniska lösningar och integrationsmöjligheter i samarbete med IT-leverantören.
 - Upprättande av projektplan med ansvarsområden, tidsplan och riskanalys.

- **Fas 2: Utveckling (2–4 månaderna)**

- **Månad 2–3:** Grundutveckling av bokningssystem, betalningsintegration och kundhantering.
- **Månad 3–4:** Implementering av uthyrningshantering och supportfunktioner, samt anpassning av systemet baserat på verksamhetens behov.
- Iterativ testning och kvalitetsgranskning för att identifiera förbättringsområden.
- Genomförande av utbildningar för personalen gällande det nya systemet.

- **Fas 3: Testning (5:te månaden)**

- Användartester med personal och kunder för att säkerställa funktionalitet och användarvänlighet.
- Säkerhetskontroller för att garantera skydd av kunddata och betalningshantering.
- Justeringar baserade på testresultat och identifierade förbättringsområden.

- **Fas 4: Lansering (6:te månaden)**

- Slutgiltig implementering och lansering av systemet.
- Informationskampanjer riktade mot kunder för att introducera det nya bokningssystemet.
- Uppföljning och insamling av feedback för att identifiera förbättringsmöjligheter på lång sikt.

6. Sprintplan


Produktbacklogg

Använda rhistorier , AH	Sprint	Namn	Kommentar	Estimat	Källa
AH 0	Sprint 0	Integration med SkiStar för att optimera verksamheten och öka intäkterna.	Undersöka vilka kontaktvägar som finns samt påbörja kontakt.	1 vecka	Team 1
AH 1	Sprint 0	Utformning av förbokningssystem.	Undersöka tekniska möjligheter till en app.	1 vecka	Team 1
AH 2	Sprint 0	Automatisering av betalningsprocess	Undersöka tekniska möjligheter för detta.	1 vecka	Team 2
AH 3	Sprint 0	Kontrollsystem för återlämning.	Undersöka tekniska möjligheterna till digital spårning av hyrd utrustning och påminnelser.	1 vecka	Team 2
AH 4	Sprint 0	Samordning med bussbolag.	Undersöka vilka kontaktvägar som finns i detta.	1 vecka	Team 1
AH 5	Sprint 0	Utbildning av personal.	Undersöka vilken introduktion som behövs för de nya IT stöden.	1 vecka	Team 2

Användarhistorier, AH

- **Vi vill få en förbättrad integration med SkiStar:** Skapa nya kontaktvägar och samarbetsavtal.
- **Vi vill kunna få en bättre utformning av förbokningssystemet:** Möjliggöra att kunder kan boka utrustning i förväg.

- **Som kund vill jag kunna betala smidigt och enkelt:** Smidigare betalning via app eller online bokning.
- **Vi vill få ett bättre kontrollsystem för återlämning av hyrd utrustning:** Tekniska lösningar föreslås för att ha kontroll över hyrd utrustning. Digitala påminnelser vid sen återlämning ska exempelvis kunna skickas ut.
- **Vi vill kunna samordna vår verksamhet med bussbolag:** Skapa system för smidig hantering av gruppbokningar.
- **Som anställd vill jag kunna få en bra introduktion till de nya IT systemen:** Ge introduktion till de nya IT stöden för en smidig och effektiv implementering.

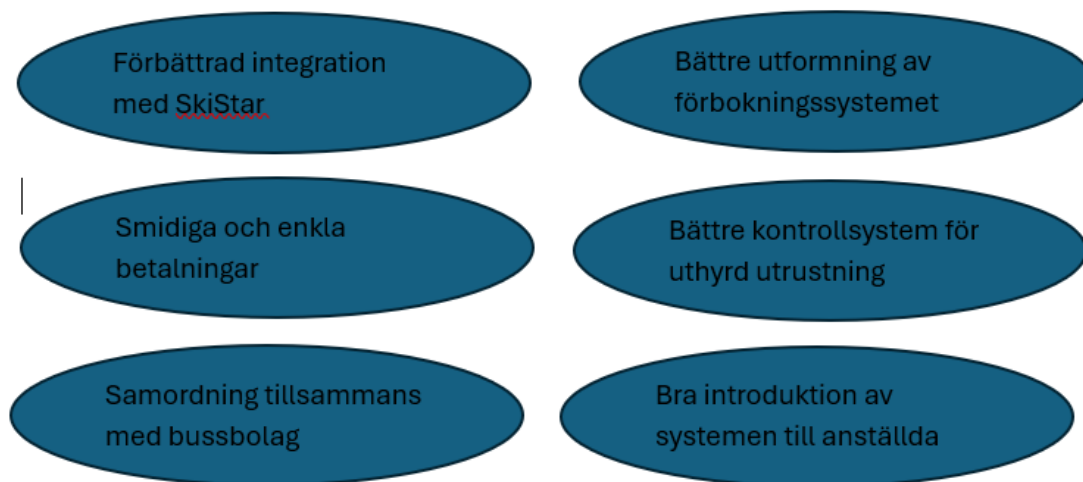

7. Daglig Plan - Sprint Backlog

Aktiviteter och Ansvar

1. Dagligt SCRUM-möte (15 min)

- Genomgång av pågående uppgifter
- Eventuella hinder identifieras och lösningar diskuteras

2. Arbetsuppgifter

- Tilldelning av uppgifter till teammedlemmar
- Statusuppdateringar och uppföljning

3. Ansvarsfördelning

- Teammedlemmar ansvarar för att rapportera framsteg
- Scrum Master säkerställer att processen följs
- Produktägare hanterar prioriteringar och vägledning

4. Daglig uppföljning

- Justering av sprintbackloggen vid behov
- Dokumentation av framsteg och beslut

Sprint Backlog

- Lista över aktuella aktiviteter från backloggen
- Prioritering av uppgifter utifrån sprintmål
- Uppdatering och justering vid behov

Uppgift	Beskrivning	Kommentar	Prio	Ansvar	Tidsuppskattning
AH3 U0	Integration med SkiStar för att optimera verksamheten och öka intäkterna	En del av moderniseringsplanen för uthyrningen	H	AN	4 dagar
AH3 U1	Utformning av förbokningssystem	Möjliggöra att kunder kan boka utrustning i förväg	H	PW	5 dagar
AH3 U2	Automatisering av betalningsprocess	Implementera digital betalning vid bokning och uthyrning	M	EA	4 dagar
AH3 U3	Kontrollsystem för återlämning	Digital spårning av hyrd utrustning och påminnelser	H	CR	3 dagar
AH3 U4	Samordning med bussbolag	Skapa system för smidig hantering av gruppbokningar	M	SG	3 dagar
AH3 U5	Utbildning av personal	Introduktion till det nya IT-stödet för smidig implementering	M	DG	2 dagar

Prioriteringsnivåer

- H (Hög prioritet): Måste genomföras omgående.
- M (Medium prioritet): Viktigt men kan planeras in.
- L (Låg prioritet): Kan genomföras vid tillfälle.

Roller och Ansvar

- Scrum Master: Leder dagliga möten och ser till att sprintplaneringen hålls.
- Produktägare: Prioriterar backloggen och hanterar vägledning.
- Teammedlemmar: Ansvarar för att genomföra tilldelade uppgifter och rapportera framsteg.

Daglig Uppföljning

- Justering av sprintbackloggen vid behov
- Dokumentation av framsteg och beslut
